




成瀬ダム基本計画第4回変更に伴う 利水負担金事業再評価の実施について



湯沢市 建設部 上下水道課

1. 事業再評価の実施サイクルについて

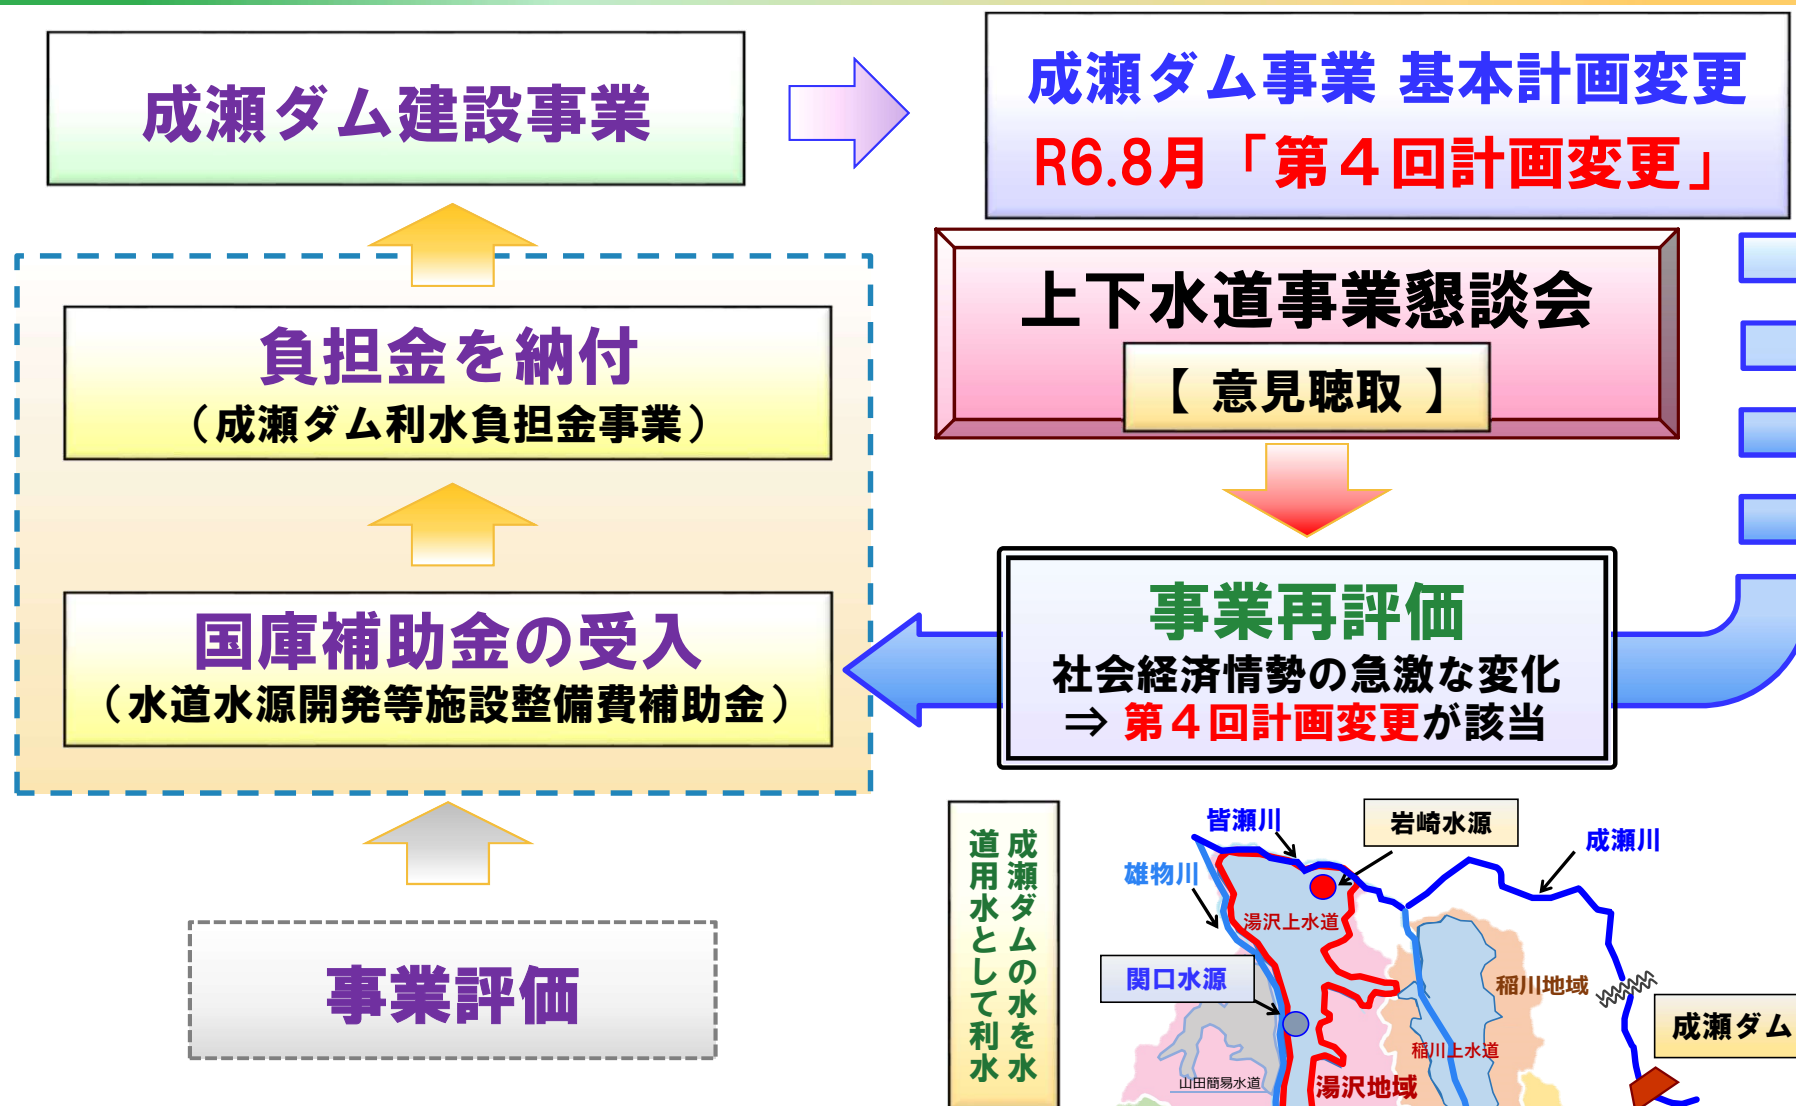

2. 成瀬ダムの基本計画変更について

基本計画変更（第4回変更）

告示（R6.8.27：国土交通省第1113号）

- ① **ダム事業の工期の変更**
ダムの完成が令和8年度から令和9年度へ **1年延伸**
- ② **ダム事業の総工費の変更**
約2,230億円から約2,600億円へ **約370億円の増額**

計画変更の主な理由

I 社会的要因の変化によるもの

- 1. 公共工事関連単価の変動
- 2. 工事積算基準の変更
- 3. 建設業の働き方改革の適用

II 現場条件の変化によるもの

- 1. 地質条件の明確化等による変更
- 2. 環境保全のための変更

III 将来の事業費の変更要因への対応

3. 事業再評価の概略について

年 月	ダ ム 関 連 事 業	事 業 評 価 関 連
平成13年 5月	国)官報告示 (国土交通省第887号)	
平成13年 7月	市)ダム利水に係る「水道事業変更認可」取得	市)ダム事業の事前評価実施
平成14年 4月	市)成瀬ダム事業へ利水参画	
平成19年11月	市)湯沢市水道ビジョン策定	市)ダム事業再評価実施 (継続)
平成23年 5月	市)ダム利水水量の下方修正	
平成23年 8月		市)ダム事業再評価実施 (継続)
平成26年 3月	国)基本計画第1回変更 (工期延長)	市)ダム事業再評価実施 (継続)
平成29年 9月	国)基本計画第2回変更 (ダム形式変更)	
平成30年 9月	国)ダム本体工事着工	
令和 3年 9月	国)基本計画第3回変更 (事業費変更、工期延長)	
令和 4年 3月		市)ダム事業再評価実施 (休止)
令和 5年 3月	市)新たな湯沢市水道ビジョン策定	
令和 6年 3月		市)ダム事業再評価実施 (継続)
令和 6年 8月	国)基本計画第4回変更 (事業費変更、工期延長)	
令和 7年 3月		市)ダム事業再評価実施

4. 事業再評価のスケジュールについて

